


## 令和2年度5月末までの対応状況(主な内容)

### 1. 災害復旧の早期発注

- ・東日本台風で越水し堤防が弱体化した2箇所の本復旧について、5月末の完了を目標に取り組む。(うち元災108号は3月末完了済)
- ・その他の箇所については、詳細設計が完了した箇所から順次発注を進め早期の工事完成を図る。

### 2. 河道掘削、支障木伐採等による流下阻害の早期解消

- ・阿武隈川の合流部から石神橋(伊手川との合流付近)の区間について河道掘削と支障木の撤去を実施。(5月下旬から現地に着手予定)

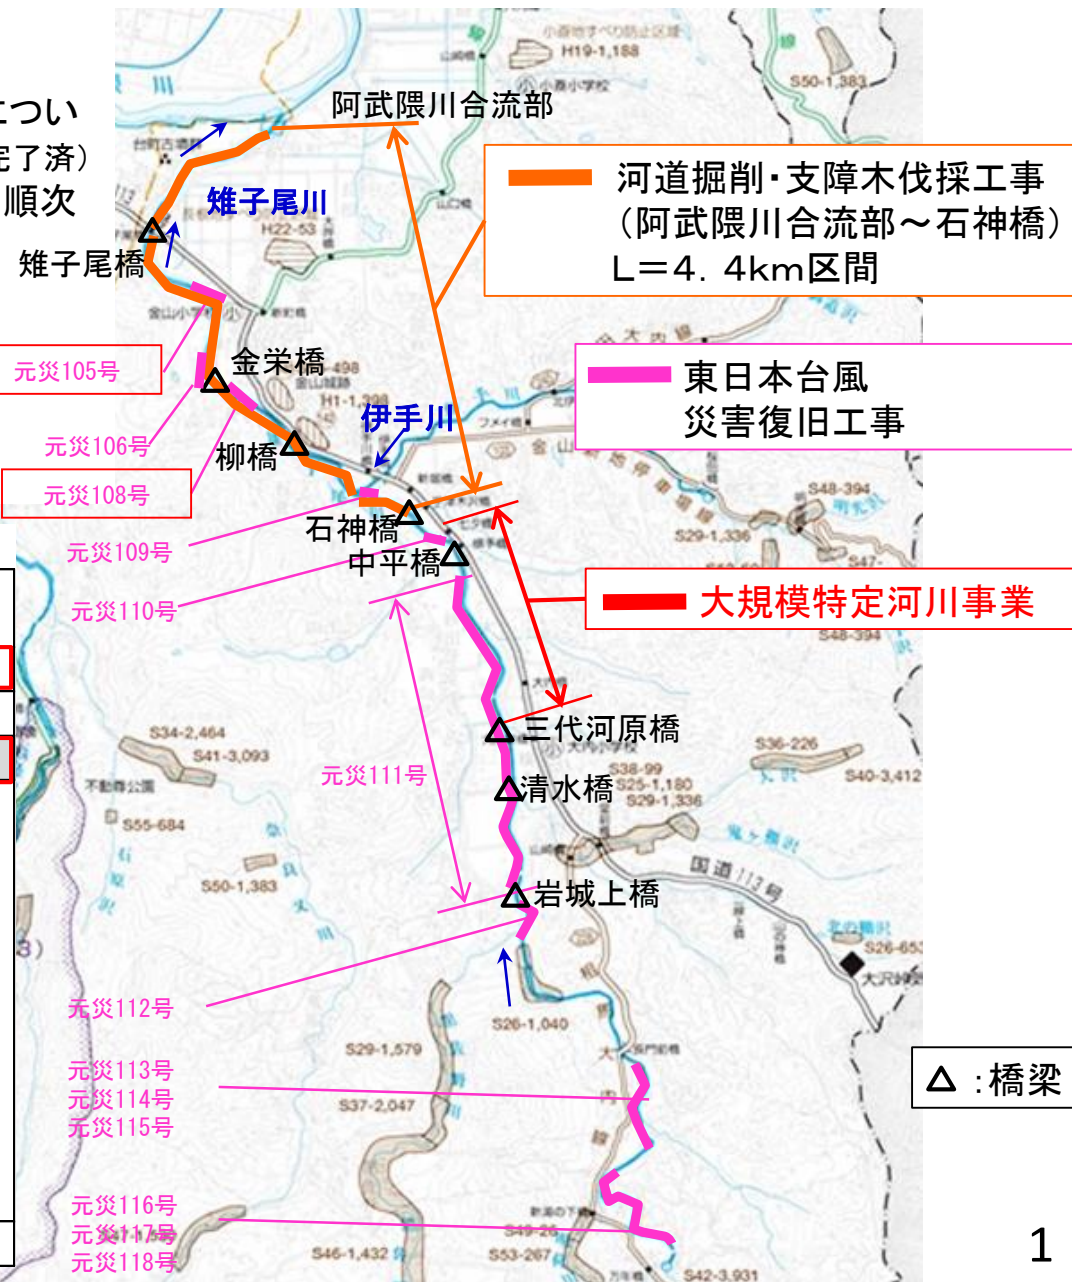

雫子尾川 災害復旧箇所一覧

	災害番号	延長 (m)	復旧状況
1	元災105号	284.4	本復旧工事中 (R2.5月末完了予定)
2	元災106号	45.0	上半期公告予定
3	元災108号	74.9	本復旧工事了 (R2.3月24日)
4	元災109号	17.0	上半期公告予定
5	元災110号	45.0	
6	元災111号	1,572.6	
7	元災112号	260.0	
8	元災113号	37.5	
9	元災114号	164.0	
10	元災115号	18.3	
11	元災116号	20.0	
12	元災117号	43.4	
13	元災118号	140.0	
合計		2,722.1	査定決定額 915,316千円

△ : 橋梁

令和元年災105号 (R2. 5月末完了予定)



右岸堤復旧状況 (施工中)

令和元年災108号 (R2. 3月末完了)



右岸堤復旧状況 (完了)
